



CV. BUJANG DAYANG

GENERAL CONTRACTOR & SUPPLIER

Jl. Perumahan Bukit Kejora Permai, No. H1 RT. 017, Desa Beluluk, Kec. Pangkalan Baru,
Kabupaten Bangka Tengah Telp. 085381084799
Email : bujangdayang@yahoo.com

LAPORAN PEKERJAAN PEMASANGAN PARTISI DI FAKULTAS KEDOKTERAAN DAN ILMU KESEHATAN



LAPORAN BULAN KE - 1

23 APRIL - 19 MEI 2024

CV. BUJANG DAYANG



CV. BUJANG DAYANG
GENERAL CONTRACTOR & SUPPLIER

Jl. Perumahan Bukit Kejora Permai, No. H1 RT. 017, Desa Beluluk, Kec. Pangkalan Baru,
Kabupaten Bangka Tengah Telp. 085381084799
Email : bujangdayang@yahoo.com


LAPORAN BULANAN FISIK PEKERJAAN

PEKERJAAN : PEKERJAAN PEMASANGAN PARTISI DI FAKULTAS KEDOKTERAAN DAN ILMU KESEHATAN
LOKASI : KAMPUS UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

BULAN KE -	1
PERIODE	23 April 2024 19 Mei 2024

NO	ITEM PEKERJAAN	VOL.	SAT.	BOBOT (%)	S/D BULAN LALU		S/D BULAN INI		S/D BULAN INI		PROGRESS FISIK %	KET.
					VOLUME	BOBOT %	VOLUME	BOBOT %	VOLUME	BOBOT %		
I	PEK. PENDAHULUAN											
	1 Pek. Administrasi dan Dokumentasi	1,00	L5	0,28			0,44	0,12	0,44	0,12	44,44	
	2 Pembersihan dan Pembongkaran	1,00	L5	0,28			0,50	0,14	0,50	0,14	50,00	
	TOTAL			0,56		-		0,27		0,27		
II	PEKERJAAN PASANGAN DINDING PARTISI											
A	PEKERJAAN DINDING DAN LANTAI											
	1 Pek. Pas. Dinding GRC BOARD											
	- Pek. Pas. Rangka Baja ringan Dinding Partisi	253,17	m2	18,23			241,29	17,37	241,29	17,37	95,31	
	- Pek. Pas. Dinding GRC Board	472,46	m2	26,20			218,55	12,12	218,55	12,12	46,26	
	2 Pek. Pas. Karpet	142,00	m2	3,59			-	-	-	-	-	
	3 Pek. Plesteran Lantai Bekas Bongkaran	4,00	m2	0,21			-	-	-	-	-	
	JUMLAH - A			48,23		-		29,49		29,49		
B	PEKERJAAN PLAFOND											
	1 Pek. Pas. Rangka Hollow Plafon	142,00	m2	13,76			-	-	-	-	-	
	2 Pek. Pas. Plafon PVC	142,00	m2	10,75			-	-	-	-	-	
	3 Pek. Pas. Lis Plafon PVC	107,00	m'	1,49			-	-	-	-	-	
	JUMLAH - B			26,00		-		-		-		
D	PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA											
	1 Pek. Pas. Pintu HPL	6,00	unit	7,24			-	-	-	-	-	
	2 Pek. Pas. Jendela aluminium komplit warna putih	2,00	unit	2,70			-	-	-	-	-	
	JUMLAH - D			9,94		-		-		-		
E	PEKERJAAN ELEKTRIKAL											
	1 Pek. Pas. Instalasi Titik Lampu	11,00	titik	1,68			-	-	-	-	-	
	2 Pek. Stop Kontak + Instalasi	8,00	titik	0,39			-	-	-	-	-	
	3 Pek. Saklar Tunggal	7,00	titik	0,32			-	-	-	-	-	
	4 Pas. MCB, 2 group/fase	1,00	titik	0,10			-	-	-	-	-	
	5 Pek. Pas. Lampu LED Downlight 19 watt	11,00	titik	0,77			-	-	-	-	-	
	JUMLAH - E			3,25		-		-		-		
F	PEKERJAAN FINISHING DAN LABURAN											
	1 Pek. Pegecatan dinding Partisi	472,46	m2	12,02			-	-	-	-	-	
	JUMLAH - F			12,02		-		-		-		
	TOTAL - II			99,44		-		29,49		29,49		
	REKAPITULASI											
NO	ITEM PEKERJAAN											
I	PEK. PENDAHULUAN			0,56		-		0,27		0,27		
II	PEKERJAAN PASANGAN DINDING PARTISI			99,44		-		29,49		29,49		
	REALISASI FISIK S.D BULAN INI			100,00		-		29,76		29,76		
	RENCANA PROGRESS KUMULATIF (%)										22,90	
	DEVIASI (%)										6,86	

Disetujui Oleh,




Diperiksa Oleh,

Disetujui Oleh,



Dibuat Oleh,

CV. BUJANG DAYANG





CV. BUJANG DAYANG

GENERAL CONTRACTOR & SUPPLIER

Jl. Perumahan Bukit Kejora Permai, No. H1 RT. 017, Desa Beluluk, Kec. Pangkalan Baru,
Kabupaten Bangka Tengah Telp. 085381084799
Email : bujangdayang@yahoo.com

TIME SCHEDULE PEKERJAAN

PEKERJAAN : PEKERJAAN PEMASANGAN PARTISI DI FAKULTAS KEDOKTERAAN DAN ILMU KESEHATAN

LOKASI : KAMPUS UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

NO	ITEM PEKERJAAN	VOL.	SAT.	BOBOT (%)	WAKTU PELAKSANAAN									KET.
					MINGGU 1	MINGGU 2	MINGGU 3	MINGGU 4	MINGGU 5	MINGGU 6	MINGGU 7	MINGGU 8	MINGGU 9	
					23-28	29-05	06-12	13-19	20-26	27-02	03-09	10-16	17-21	
I	PEK. PENDAHULUAN													
	1. Pek. Administrasi dan Dokumentasi	1,00	LS	0,28	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	
	2. Pembersihan dan Pembongkaran	1,00	LS	0,28	0,14								0,14	
	TOTAL			0,56										
II	PEKERJAAN PASANGAN DINDING PARTISI													
A	PEKERJAAN DINDING DAN LANTAI													
	1. Pek. Pas. Dinding GRC BOARD													
	- Pek. Pas. Rangka Baja ringan Dinding Partisi	253,17	m2	18,23	3,04	3,04	3,04	3,04	3,04	3,04				
	- Pek. Pas. Dinding GRC Board	472,46	m2	26,20			5,24	5,24	5,24	5,24	5,24			
	2. Pek. Pas. Karpet	142,00	m2	3,59									3,59	
	3. Pek. Plesteran Lantai Bekas Bongkaran	4,00	m2	0,21									0,21	
	JUMLAH - A			48,23										
B	PEKERJAAN PLAFOND													
	1. Pek. Pas. Rangka Hollow Plafon	142,00	m2	13,76							4,59	4,59	4,59	
	2. Pek. Pas. Plafon PVC	142,00	m2	10,75								5,37	5,37	
	3. Pek. Pas. Lis Plafon PVC	107,00	m'	1,49								0,74	0,74	
	JUMLAH - B			26,00										
D	PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA													
	1. Pek. Pas. Pintu HPL	6,00	unit	7,24									7,24	
	2. Pek. Pas. Jendela aluminium komplet warna putih	2,00	unit	2,70									2,70	
	JUMLAH - D			9,94										
E	PEKERJAAN ELEKTRIKAL													
	1. Pek. Pas. Instalasi Titik Lampu	11,00	titik	1,68								1,68		
	2. Pek. Stop Kontak + Instalasi	8,00	titik	0,39									0,39	
	3. Pek. Saklar Tunggal	7,00	titik	0,32									0,32	
	4. Pas. MCB, 2 group/fase	1,00	titik	0,10									0,10	
	5. Pek. Pas. Lampu LED Downlight 19 watt	11,00	titik	0,77									0,77	
	JUMLAH - E			3,25										
F	PEKERJAAN FINISHING DAN LABURAN													
	1. Pek. Pegecatan dinding Partisi	472,46	m2	12,02						3,01	3,01	3,01	3,01	
	JUMLAH - F			12,02										
	TOTAL - II			99,44										
REKAPITULASI														
NO	ITEM PEKERJAAN													
I	PEK. PENDAHULUAN			0,56										
II	PEKERJAAN PASANGAN DINDING PARTISI			99,44										
	REALISASI FISIK S.D MINGGU INI			100,00	3,21	3,07	8,31	8,31	8,31	11,32	12,86	15,42	29,19	
	RENCANA PROGRESS KOMULATIF (%)				3,21	6,28	14,59	22,90	31,21	42,52	55,39	70,81	100,00	
	BOBOT REALISASI KOMULATIF (%)				3,61	8,44	20,35	29,76						
	DEVIASI (%)				0,40	2,16	5,76	6,86						

Disetujui Oleh,

Pelaksana Lapangan (PPK)

Diperiksa Oleh,

Pegawas Lapangan

Universitas Bangka Belitung

Dibuat Oleh,

CV. BUJANG DAYANG

CV. BUJANG DAYANG



CV. BUJANG DAYANG
GENERAL CONTRACTOR & SUPPLIER

Jl. Perumahan Bukit Kejora Permai, No. H1 RT. 017, Desa Beluluk, Kec. Pangkalan Baru,
Kabupaten Bangka Tengah Telp. 085381084799
Email : bujangdayang@yahoo.com

LAPORAN MINGGUAN FISIK PEKERJAAN

PEKERJAAN : PEKERJAAN PEMASANGAN PARTISI DI FAKULTAS KEDOKTERAAN DAN ILMU KESEHATAN
LOKASI : KAMPUS UNIVERSITAS BANGKA BELUTUNG

MINGGU KE -	1
PERIODE	23 April 2024 28 April 2024

NO	ITEM PEKERJAAN	VOL.	SAT.	BOBOT (%)	S/D MINGGU LALU		S/D MINGGU INI		S/D MINGGU INI		PROGRESS FISIK %	KET.
					VOLUME	BOBOT %	VOLUME	BOBOT %	VOLUME	BOBOT %		
I	PEK. PENDAHULUAN											
	1. Pek. Administrasi dan Dokumentasi	1,00	LS	0,28			0,11	0,03	0,11	0,03	11,11	
	2. Pembersihan dan Pembongkaran	1,00	LS	0,28			0,50	0,14	0,50	0,14	50,00	
	TOTAL			0,56		-		0,17		0,17		
II	PEKERJAAN PASANGAN DINDING PARTISI											
A	PEKERJAAN DINDING DAN LANTAI											
	1. Pek. Pas. Dinding GRC BOARD											
	- Pek. Pas. Rangka Baja ringan Dinding Partisi	253,17	m2	18,23			47,77	3,44	47,77	3,44	18,87	
	- Pek. Pas. Dinding GRC Board	472,46	m2	26,20			-	-	-	-	-	
	2. Pek. Pas. Karpet	142,00	m2	3,59			-	-	-	-	-	
	3. Pek. Plesteran Lantai Bekas Bongkaran	4,00	m2	0,21			-	-	-	-	-	
	JUMLAH - A			48,23		-		3,44		3,44		
B	PEKERJAAN PLAFOND											
	1. Pek. Pas. Rangka Hollow Plafon	142,00	m2	13,76			-	-	-	-	-	
	2. Pek. Pas. Plafon PVC	142,00	m2	10,75			-	-	-	-	-	
	3. Pek. Pas. Lis Plafon PVC	107,00	m'	1,49			-	-	-	-	-	
	JUMLAH - B			26,00		-		-		-		
D	PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA											
	1. Pek. Pas. Pintu HPL	6,00	unit	7,24			-	-	-	-	-	
	2. Pek. Pas. Jendela aluminium komplit warna putih	2,00	unit	2,70			-	-	-	-	-	
	JUMLAH - D			9,94		-		-		-		
E	PEKERJAAN ELEKTRIKAL											
	1. Pek. Pas. Instalasi Titik Lampu	11,00	titik	1,68			-	-	-	-	-	
	2. Pek. Stop Kontak + Instalasi	8,00	titik	0,39			-	-	-	-	-	
	3. Pek. Saklar Tunggal	7,00	titik	0,32			-	-	-	-	-	
	4. Pas. MCB, 2 group/fase	1,00	titik	0,10			-	-	-	-	-	
	5. Pek. Pas. Lampu LED Downlight 19 watt	11,00	titik	0,77			-	-	-	-	-	
	JUMLAH - E			3,25		-		-		-		
F	PEKERJAAN FINISHING DAN LABURAN											
	1. Pek. Pegecatan dinding Partisi	472,46	m2	12,02			-	-	-	-	-	
	JUMLAH - F			12,02		-		-		-		
	TOTAL - II			99,44		-		3,44		3,44		
REKAPITULASI												
NO	ITEM PEKERJAAN											
I	PEK. PENDAHULUAN			0,56		-		0,17		0,17		
II	PEKERJAAN PASANGAN DINDING PARTISI			99,44		-		3,44		3,44		
	REALISASI FISIK S.D MINGGU INI			100,00		-		3,61		3,61		
	RENCANA PROGRESS KOMULATIF (%)										3,21	
	DEVIASI (%)										0,40	


Disetujui Oleh,

Pelihat Penyerah Koneksi (DPK)

Diperiksa Oleh,

Pegawas Lapangan

Dibuat Oleh,





CV. BUJANG DAYANG
GENERAL CONTRACTOR & SUPPLIER

Jl. Perumahan Bukit Kejora Permai, No. H1 RT. 017, Desa Beluluk, Kec. Pangkalan Baru,
Kabupaten Bangka Tengah Telp. 085381084799
Email : bujangdayang@yahoo.com


LAPORAN MINGGUAN FISIK PEKERJAAN

MINGGU KE	2
PERIODE	29 April 2024 05 Mei 2024


PEKERJAAN : PEKERJAAN PEMASANGAN PARTISI DI FAKULTAS KEDOKTERAAN DAN ILMU KESEHATAN
LOKASI : KAMPUS UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

NO	ITEM PEKERJAAN	VOL.	SAT.	BOBOT (%)	S/D MINGGU LALU		S/D MINGGU INI		S/D MINGGU INI		PROGRESS FISIK %	KET.
					VOLUME	BOBOT %	VOLUME	BOBOT %	VOLUME	BOBOT %		
I	PEK. PENDAHULUAN											
	1. Pek. Administrasi dan Dokumentasi	1,00	LS	0,28	0,11	0,03	0,11	0,03	0,22	0,06	22,22	
	2. Pembersihan dan Pembongkaran	1,00	LS	0,28	0,50	0,14	-	-	0,50	0,14	50,00	
	TOTAL			0,56		0,17		0,03		0,20		
II	PEKERJAAN PASANGAN DINDING PARTISI											
A	PEKERJAAN DINDING DAN LANTAI											
	1. Pek. Pas. Dinding GRC BOARD											
	- Pek. Pas. Rangka Baja ringan Dinding Partisi	253,17	m2	18,23	47,77	3,44	66,62	4,80	114,39	8,24	45,18	
	- Pek. Pas. Dinding GRC Board	472,46	m2	26,20	-	-	-	-	-	-	-	
	2. Pek. Pas. Karpet	142,00	m2	3,59	-	-	-	-	-	-	-	
	3. Pek. Plesteran Lantai Bekas Bongkaran	4,00	m2	0,21	-	-	-	-	-	-	-	
	JUMLAH - A			48,23		3,44		4,80		8,24		
B	PEKERJAAN PLAFOND											
	1. Pek. Pas. Rangka Hollow Plafon	142,00	m2	13,76	-	-	-	-	-	-	-	
	2. Pek. Pas. Plafon PVC	142,00	m2	10,75	-	-	-	-	-	-	-	
	3. Pek. Pas. Lis Plafon PVC	107,00	m'	1,49	-	-	-	-	-	-	-	
	JUMLAH - B			26,00		-		-		-		
D	PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA											
	1. Pek. Pas. Pintu HPL	6,00	unit	7,24	-	-	-	-	-	-	-	
	2. Pek. Pas. Jendela aluminium komplit warna putih	2,00	unit	2,70	-	-	-	-	-	-	-	
	JUMLAH - D			9,94		-		-		-		
E	PEKERJAAN ELEKTRIKAL											
	1. Pek. Pas. Instalasi Titik Lampu	11,00	titik	1,68	-	-	-	-	-	-	-	
	2. Pek. Stop Kontak + Instalasi	8,00	titik	0,39	-	-	-	-	-	-	-	
	3. Pek. Saklar Tunggal	7,00	titik	0,32	-	-	-	-	-	-	-	
	4. Pas. MCB, 2 group/fase	1,00	titik	0,10	-	-	-	-	-	-	-	
	5. Pek. Pas. Lampu LED Downlight 19 watt	11,00	titik	0,77	-	-	-	-	-	-	-	
	JUMLAH - E			3,25		-		-		-		
F	PEKERJAAN FINISHING DAN LABURAN											
	1. Pek. Pegecatan dinding Partisi	472,46	m2	12,02	-	-	-	-	-	-	-	
	JUMLAH - F			12,02		-		-		-		
	TOTAL - II			99,44		3,44		4,80		8,24		
REKAPITULASI												
NO	ITEM PEKERJAAN											
I	PEK. PENDAHULUAN			0,56		0,17		0,03		0,20		
II	PEKERJAAN PASANGAN DINDING PARTISI			99,44		3,44		4,80		8,24		
	REALISASI FISIK S.D MINGGU INI			100,00		3,61		4,83		8,44		
	RENCANA PROGRESS KUMULATIF (%)									6,28		
	DEVIASI (%)									2,16		


Disetujui Oleh,
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)



Diperiksa Oleh,
Pegawas Lapangan



Dibuat Oleh,





CV. BUJANG DAYANG
GENERAL CONTRACTOR & SUPPLIER

Jl. Perumahan Bukit Kejora Permai, No. H1 RT. 017, Desa Beluluk, Kec. Pangkalan Baru,
Kabupaten Bangka Tengah Telp. 085381084799
Email : bujangdayang@yahoo.com

LAPORAN MINGGUAN FISIK PEKERJAAN

MINGGU KE -	3
PERIODE	06 Mei 2024
	12 Mei 2024

PEKERJAAN : PEKERJAAN PEMASANGAN PARTISI DI FAKULTAS KEDOKTERAAN DAN ILMU KESEHATAN
LOKASI : KAMPUS UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG


NO	ITEM PEKERJAAN	VOL.	SAT.	BOBOT (%)	S/D MINGGU LALU		S/D MINGGU INI		S/D MINGGU INI		PROGRESS	KET.
					VOLUME	BOBOT %	VOLUME	BOBOT %	VOLUME	BOBOT %	FISIK %	
I	PEK. PENDAHULUAN											
	1. Pek. Administrasi dan Dokumentasi	1,00	LS	0,28	0,22	0,06	0,11	0,03	0,33	0,09	33,33	
	2. Pembersihan dan Pembongkaran	1,00	LS	0,28	0,50	0,14	-	-	0,50	0,14	50,00	
	TOTAL			0,56		0,20		0,03		0,23		
II	PEKERJAAN PASANGAN DINDING PARTISI											
A	PEKERJAAN DINDING DAN LANTAI											
	1. Pek. Pas. Dinding GRC BOARD											
	-Pek. Pas. Rangka Baja ringan Dinding Partisi	253,17	m2	18,23	114,39	8,24	66,62	4,80	181,02	13,03	71,50	
	-Pek. Pas. Dinding GRC Board	472,46	m2	26,20	-	-	127,69	7,08	127,69	7,08	27,03	
	2. Pek. Pas. Karpet	142,00	m2	3,59	-	-	-	-	-	-	-	
	3. Pek. Plesteran Lantai Bekas Bongkaran	4,00	m2	0,21	-	-	-	-	-	-	-	
	JUMLAH - A			48,23		8,24		11,88		20,11		
B	PEKERJAAN PLAFOND											
	1. Pek. Pas. Rangka Hollow Plafon	142,00	m2	13,76	-	-	-	-	-	-	-	
	2. Pek. Pas. Plafon PVC	142,00	m2	10,75	-	-	-	-	-	-	-	
	3. Pek. Pas. Lis Plafon PVC	107,00	m'	1,49	-	-	-	-	-	-	-	
	JUMLAH - B			26,00		-		-		-		
D	PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA											
	1. Pek. Pas. Pintu HPL	6,00	unit	7,24	-	-	-	-	-	-	-	
	2. Pek. Pas. Jendela aluminium komplit warna putih	2,00	unit	2,70	-	-	-	-	-	-	-	
	JUMLAH - D			9,94		-		-		-		
E	PEKERJAAN ELEKTRIKAL											
	1. Pek. Pas. Instalasi Titik Lampu	11,00	titik	1,68	-	-	-	-	-	-	-	
	2. Pek. Stop Kontak + Instalasi	8,00	titik	0,39	-	-	-	-	-	-	-	
	3. Pek. Saklar Tunggal	7,00	titik	0,32	-	-	-	-	-	-	-	
	4. Pas. MCB, 2 group/fase	1,00	titik	0,10	-	-	-	-	-	-	-	
	5. Pek. Pas. Lampu LED Downlight 19 watt	11,00	titik	0,77	-	-	-	-	-	-	-	
	JUMLAH - E			3,25		-		-		-		
F	PEKERJAAN FINISHING DAN LABURAN											
	1. Pek. Pegecatan dinding Partisi	472,46	m2	12,02	-	-	-	-	-	-	-	
	JUMLAH - F			12,02		-		-		-		
	TOTAL - II			99,44		8,24		11,88		20,11		
REKAPITULASI												
NO	ITEM PEKERJAAN											
I	PEK. PENDAHULUAN			0,56		0,20		0,03		0,23		
II	PEKERJAAN PASANGAN DINDING PARTISI			99,44		8,24		11,88		20,11		
	REALISASI FISIK S.D MINGGU INI			100,00		8,44		11,91		20,35		
	RENCANA PROGRESS KUMULATIF (%)									14,59		
	DEVIASI (%)									5,76		

Disetujui Oleh,



Diperiksa Oleh,

Pegawas Lapangan



Dibuat Oleh,

CV. BUJANG DAYANG





CV. BUJANG DAYANG
GENERAL CONTRACTOR & SUPPLIER

Jl. Perumahan Bukit Kejora Permai, No. H1 RT. 017, Desa Beluluk, Kec. Pangkalan Baru,
Kabupaten Bangka Tengah Telp. 085381084799
Email : bujangdayang@yahoo.com

LAPORAN MINGGUAN FISIK PEKERJAAN

PEKERJAAN : PEKERJAAN PEMASANGAN PARTISI DI FAKULTAS KEDOKTERAAN DAN ILMU KESEHATAN
LOKASI : KAMPUS UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

MINGGU KE -	4
PERIODE	13 Mei 2024 19 Mei 2024

NO	ITEM PEKERJAAN	VOL.	SAT.	BOBOT (%)	S/D MINGGU LALU		S/D MINGGU INI		S/D MINGGU INI		PROGRESS FISIK %	KET.
					VOLUME	BOBOT %	VOLUME	BOBOT %	VOLUME	BOBOT %		
I	PEK. PENDAHULUAN											
	1. Pek. Administrasi dan Dokumentasi	1,00	LS	0,28	0,33	0,09	0,11	0,03	0,44	0,12	44,44	
	2. Pembersihan dan Pembongkaran	1,00	LS	0,28	0,50	0,14			0,50	0,14	50,00	
	TOTAL			0,56		0,23		0,03		0,27		
II	PEKERJAAN PASANGAN DINDING PARTISI											
A	PEKERJAAN DINDING DAN LANTAI											
	1. Pek. Pas. Dinding GRC BOARD											
	- Pek. Pas. Rangka Baja ringan Dinding Partisi	253,17	m2	18,23	181,02	13,03	60,28	4,34	241,29	17,37	95,31	
	- Pek. Pas. Dinding GRC Board	472,46	m2	26,20	127,69	7,08	90,86	5,04	218,55	12,12	46,26	
	2. Pek. Pas. Karpet	142,00	m2	3,59	-	-	-	-	-	-	-	
	3. Pek. Plesteran Lantai Bekas Bongkaran	4,00	m2	0,21	-	-	-	-	-	-	-	
	JUMLAH - A			48,23		20,11		9,38		29,49		
B	PEKERJAAN PLAFOND											
	1. Pek. Pas. Rangka Hollow Plafon	142,00	m2	13,76	-	-	-	-	-	-	-	
	2. Pek. Pas. Plafon PVC	142,00	m2	10,75	-	-	-	-	-	-	-	
	3. Pek. Pas. Lis Plafon PVC	107,00	m'	1,49	-	-	-	-	-	-	-	
	JUMLAH - B			26,00		-		-		-		
D	PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA											
	1. Pek. Pas. Pintu HPL	6,00	unit	7,24	-	-	-	-	-	-	-	
	2. Pek. Pas. Jendela aluminium komplit warna putih	2,00	unit	2,70	-	-	-	-	-	-	-	
	JUMLAH - D			9,94		-		-		-		
E	PEKERJAAN ELEKTRIKAL											
	1. Pek. Pas. Instalasi Titik Lampu	11,00	titik	1,68	-	-	-	-	-	-	-	
	2. Pek. Stop Kontak + Instalasi	8,00	titik	0,39	-	-	-	-	-	-	-	
	3. Pek. Saklar Tunggal	7,00	titik	0,32	-	-	-	-	-	-	-	
	4. Pas. MCB, 2 group/fase	1,00	titik	0,10	-	-	-	-	-	-	-	
	5. Pek. Pas. Lampu LED Downlight 19 watt	11,00	titik	0,77	-	-	-	-	-	-	-	
	JUMLAH - E			3,25		-		-		-		
F	PEKERJAAN FINISHING DAN LABURAN											
	1. Pek. Pegecatan dinding Partisi	472,46	m2	12,02	-	-	-	-	-	-	-	
	JUMLAH - F			12,02		-		-		-		
	TOTAL - II			99,44		20,11		9,38		29,49		
	REKAPITULASI											
NO	ITEM PEKERJAAN											
I	PEK. PENDAHULUAN			0,56		0,23		0,03		0,27		
II	PEKERJAAN PASANGAN DINDING PARTISI			99,44		20,11		9,38		29,49		
	REALISASI FISIK S.D MINGGU INI			100,00		20,35		9,41		29,76		
	RENCANA PROGRESS KUMULATIF (%)									22,90		
	DEVIASI (%)									6,86		

Disetujui Oleh,

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Diperiksa Oleh,

Pegawas Lapangan

Dibuat Oleh,

CV. BUJANG DAYANG

LAPORAN BULAN KE - 2

20 MEI - 19 JUNI 2024

CV. BUJANG DAYANG



CV. BUJANG DAYANG
GENERAL CONTRACTOR & SUPPLIER

Jl. Perumahan Bukit Kejora Permai, No. H1 RT. 017, Desa Beluluk, Kec. Pangkalan Baru,
Kabupaten Bangka Tengah Telp. 085381084799
Email : bujangdayang@yahoo.com

LAPORAN BULANAN FISIK PEKERJAAN

PEKERJAAN : PEKERJAAN PEMASANGAN PARTISI DI FAKULTAS KEDOKTERAAN DAN ILMU KESEHATAN
LOKASI : KAMPUS UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

BULAN KE -	2
PERIODE	20 Mei 2024
	19 Juni 2024

NO	ITEM PEKERJAAN	VOL.	SAT.	ROBOT (%)	S/D BULAN LALU		S/D BULAN INI		S/D BULAN INI		PROGRESS	KET.
					VOLUME	BOBOT %	VOLUME	BOBOT %	VOLUME	BOBOT %	FISIK %	
I	PEK. PENDAHULUAN											
	1 Pek. Administrasi dan Dokumentasi	1,00	L5	0,28	0,44	0,12	0,56	0,16	1,00	0,28	100,00	
	2 Pembersihan dan Pembongkaran	1,00	L5	0,28	0,50	0,14	0,50	0,14	1,00	0,28	100,00	
	TOTAL			0,56		0,27		0,30		0,56		
II	PEKERJAAN PASANGAN DINDING PARTISI											
A	PEKERJAAN DINDING DAN LANTAI											
	1 Pek. Pas. Dinding GRC BOARD											
	- Pek. Pas. Rangka Baja ringan Dinding Partisi	253,17	m2	18,23	241,29	17,37	11,88	0,86	253,17	18,23	100,00	
	- Pek. Pas. Dinding GRC Board	472,46	m2	26,20	218,55	12,12	253,91	14,08	472,46	26,20	100,00	
	2 Pek. Pas. Karpet	142,00	m2	3,59	-	-	142,00	3,59	142,00	3,59	100,00	
	3 Pek. Plesteran Lantai Bekas Bongkaran	4,00	m2	0,21	-	-	4,00	0,21	4,00	0,21	100,00	
	JUMLAH - A			48,23		29,49		18,73		48,23		
B	PEKERJAAN PLAFOND											
	1 Pek. Pas. Rangka Hollow Plafon	142,00	m2	13,76	-	-	142,00	13,76	142,00	13,76	100,00	
	2 Pek. Pas. Plafon PVC	142,00	m2	10,75	-	-	142,00	10,75	142,00	10,75	100,00	
	3 Pek. Pas. Lis Plafon PVC	107,00	m'	1,49	-	-	107,00	1,49	107,00	1,49	100,00	
	JUMLAH - B			26,00		-		26,00		26,00		
D	PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA											
	1 Pek. Pas. Pintu HPL	6,00	unit	7,24	-	-	6,00	7,24	6,00	7,24	100,00	
	2 Pek. Pas. Jendela aluminium komplit warna putih	2,00	unit	2,70	-	-	2,00	2,70	2,00	2,70	100,00	
	JUMLAH - D			9,94		-		9,94		9,94		
E	PEKERJAAN ELEKTRIKAL											
	1 Pek. Pas. Instalasi Titik Lampu	11,00	titik	1,68	-	-	11,00	1,68	11,00	1,68	100,00	
	2 Pek. Stop Kontak + Instalasi	8,00	titik	0,39	-	-	8,00	0,39	8,00	0,39	100,00	
	3 Pek. Saklar Tunggal	7,00	titik	0,32	-	-	7,00	0,32	7,00	0,32	100,00	
	4 Pas. MCB, 2 group/fase	1,00	titik	0,10	-	-	1,00	0,10	1,00	0,10	100,00	
	5 Pek. Pas. Lampu LED Downlight 19 watt	11,00	titik	0,77	-	-	11,00	0,77	11,00	0,77	100,00	
	JUMLAH - E			3,25		-		3,25		3,25		
F	PEKERJAAN FINISHING DAN LABURAN											
	1 Pek. Pegecatan dinding Partisi	472,46	m2	12,02	-	-	472,46	12,02	472,46	12,02	100,00	
	JUMLAH - F			12,02		-		12,02		12,02		
	TOTAL - II			99,44		29,49		69,94		99,44		
REKAPITULASI												
NO	ITEM PEKERJAAN											
I	PEK. PENDAHULUAN			0,56		0,27		0,30		0,56		
II	PEKERJAAN PASANGAN DINDING PARTISI			99,44		29,49		69,94		99,44		
	REALISASI FISIK S.D BULAN INI			100,00		29,76		70,24		100,00		
	RENCANA PROGRESS KUMULATIF (%)									100,00		
	DEVIASI (%)									-		



Disetujui Oleh,

Diperiksa Oleh,

Dibuat Oleh,



Pegawas Lapangan



BUJANG DAYANG



CV. BUJANG DAYANG
GENERAL CONTRACTOR & SUPPLIER

Jl. Perumahan Bukit Kejora Permai, No. H1 RT. 017, Desa Beluluk, Kec. Pangkalan Baru,
Kabupaten Bangka Tengah Telp. 085381084799
Email : bujangdayang@yahoo.com

TIME SCHEDULE PEKERJAAN

PEKERJAAN : PEKERJAAN PEMASANGAN PARTISI DI FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN

LOKASI : KAMPUS UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

NO	ITEM PEKERJAAN	VOL.	SAT.	BOBOT (%)	WAKTU PELAKSANAAN									KET.
					MINGGU 1	MINGGU 2	MINGGU 3	MINGGU 4	MINGGU 5	MINGGU 6	MINGGU 7	MINGGU 8	MINGGU 9	
					23-28	29-05	06-12	13-19	20-26	27-02	03-09	10-16	17-21	
I	PEK. PENDAHULUAN													
	1. Pek. Administrasi dan Dokumentasi	1,00	LS	0,28	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
	2. Pembersihan dan Pembongkaran	1,00	LS	0,28	0,14									0,14
	TOTAL			0,56										
II	PEKERJAAN PASANGAN DINDING PARTISI													
A	PEKERJAAN DINDING DAN LANTAI													
	1. Pek. Pas. Dinding GRC BOARD													
	- Pek. Pas. Rangka Baja ringan Dinding Partisi	253,17	m2	18,23	3,04	3,04	3,04	3,04	3,04	3,04				
	- Pek. Pas. Dinding GRC Board	472,46	m2	26,20			5,24	5,24	5,24	5,24	5,24			
	2. Pek. Pas. Karpet	142,00	m2	3,59										3,59
	3. Pek. Plesteran Lantai Bekas Bongkaran	4,00	m2	0,21										0,21
	JUMLAH - A			48,23										
B	PEKERJAAN PLAFOND													
	1. Pek. Pas. Rangka Hollow Plafon	142,00	m2	13,76										
	2. Pek. Pas. Plafon PVC	142,00	m2	10,75										
	3. Pek. Pas. Lis Plafon PVC	107,00	m'	1,49										
	JUMLAH - B			26,00										
D	PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA													
	1. Pek. Pas. Pintu HPL	6,00	unit	7,24										7,24
	2. Pek. Pas. Jendela aluminium komplet warna putih	2,00	unit	2,70										2,70
	JUMLAH - D			9,94										
E	PEKERJAAN ELEKTRIKAL													
	1. Pek. Pas. Instalasi Titik Lampu	11,00	titik	1,68									1,68	
	2. Pek. Stop Kontak + Instalasi	8,00	titik	0,39										0,39
	3. Pek. Saklar Tunggal	7,00	titik	0,32										0,32
	4. Pas. MCB, 2 group/fase	1,00	titik	0,10										0,10
	5. Pek. Pas. Lampu LED Downlight 19 watt	11,00	titik	0,77										0,77
	JUMLAH - E			3,25										
F	PEKERJAAN FINISHING DAN LABURAN													
	1. Pek. Pegecatan dinding Partisi	472,46	m2	12,02						3,01	3,01	3,01	3,01	
	JUMLAH - F			12,02										
	TOTAL - II			99,44										
REKAPITULASI														
NO	ITEM PEKERJAAN													
I	PEK. PENDAHULUAN			0,56										
II	PEKERJAAN PASANGAN DINDING PARTISI			99,44										
	REALISASI FISIK S.D MINGGU INI			100,00	3,21	3,07	8,31	8,31	8,31	11,32	12,86	15,42	29,19	
	RENCANA PROGRESS KUMULATIF (%)				3,21	6,28	14,59	22,90	31,21	42,52	55,39	70,81	100,00	
	BOBOT REALISASI KUMULATIF (%)				3,61	8,44	20,35	29,76	36,69	36,72	56,80	92,30	100,00	
	DEVIASI (%)				0,40	2,16	5,76	6,86	5,48	5,81	1,41	21,49	-	

Disetujui Oleh,

Peljabat Pembuat Komitmen (PPK)

Diperiksa Oleh,

Pegawas Lapangan

Dibuat Oleh,

CV. BUJANG DAYANG



CV. BUJANG DAYANG
GENERAL CONTRACTOR & SUPPLIER

Jl. Perumahan Bukit Kejora Permai, No. H1 RT. 017, Desa Beluluk, Kec. Pangkalan Baru,
Kabupaten Bangka Tengah Telp. 085381084799
Email : bujangdayang@yahoo.com

LAPORAN MINGGUAN FISIK PEKERJAAN


MINGGU KE -	5
PERIODE	20 Mei 2024
	26 Mei 2024

PEKERJAAN : PEKERJAAN PEMASANGAN PARTISI DI FAKULTAS KEDOKTERAAN DAN ILMU KESEHATAN
LOKASI : KAMPUS UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

NO	ITEM PEKERJAAN	VOL.	SAT.	BOBOT (%)	S/D MINGGU LALU		S/D MINGGU INI		S/D MINGGU INI		PROGRESS	KET.
					VOLUME	BOBOT %	VOLUME	BOBOT %	VOLUME	BOBOT %	FISIK %	
I	PEK. PENDAHULUAN											
	1. Pek. Administrasi dan Dokumentasi	1,00	LS	0,28	0,44	0,12	0,11	0,03	0,56	0,16	55,56	
	2. Pembersihan dan Pembongkaran	1,00	LS	0,28	0,50	0,14			0,50	0,14	50,00	
	TOTAL			0,56		0,27		0,03		0,30		
II	PEKERJAAN PASANGAN DINDING PARTISI											
A	PEKERJAAN DINDING DAN LANTAI											
	1. Pek. Pas. Dinding GRC BOARD											
	-Pek. Pas. Rangka Baja ringan Dinding Partisi	253,17	m2	18,23	241,29	17,37			241,29	17,37	95,31	
	-Pek. Pas. Dinding GRC Board	472,46	m2	26,20	218,55	12,12	124,33	6,90	342,88	19,02	72,57	
	2. Pek. Pas. Karpet	142,00	m2	3,59	-	-			-	-	-	
	3. Pek. Plesteran Lantai Bekas Bongkaran	4,00	m2	0,21	-	-			-	-	-	
	JUMLAH - A			48,23		29,49		6,90		36,39		
B	PEKERJAAN PLAFOND											
	1. Pek. Pas. Rangka Hollow Plafon	142,00	m2	13,76	-	-			-	-	-	
	2. Pek. Pas. Plafon PVC	142,00	m2	10,75	-	-			-	-	-	
	3. Pek. Pas. Lis Plafon PVC	107,00	m'	1,49	-	-			-	-	-	
	JUMLAH - B			26,00		-		-		-		
D	PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA											
	1. Pek. Pas. Pintu HPL	6,00	unit	7,24	-	-			-	-	-	
	2. Pek. Pas. Jendela aluminium komplit warna putih	2,00	unit	2,70	-	-			-	-	-	
	JUMLAH - D			9,94		-		-		-		
E	PEKERJAAN ELEKTRIKAL											
	1. Pek. Pas. Instalasi Titik Lampu	11,00	titik	1,68	-	-			-	-	-	
	2. Pek. Stop Kontak + Instalasi	8,00	titik	0,39	-	-			-	-	-	
	3. Pek. Saklar Tunggal	7,00	titik	0,32	-	-			-	-	-	
	4. Pas. MCB, 2 group/fase	1,00	titik	0,10	-	-			-	-	-	
	5. Pek. Pas. Lampu LED Downlight 19 watt	11,00	titik	0,77	-	-			-	-	-	
	JUMLAH - E			3,25		-		-		-		
F	PEKERJAAN FINISHING DAN LABURAN											
	1. Pek. Pegecatan dinding Partisi	472,46	m2	12,02	-	-			-	-	-	
	JUMLAH - F			12,02		-		-		-		
	TOTAL - II			99,44		29,49		6,90		36,39		
	REKAPITULASI											
NO	ITEM PEKERJAAN											
I	PEK. PENDAHULUAN			0,56		0,27		0,03		0,30		
II	PEKERJAAN PASANGAN DINDING PARTISI			99,44		29,49		6,90		36,39		
	REALISASI FISIK S.D MINGGU INI			100,00		29,76		6,93		36,69		
	RENCANA PROGRESS KUMULATIF (%)									31,21		
	DEVIASI (%)									5,48		


Disetujui Oleh,

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)




Diperiksa Oleh,

Pegawas Lapangan



Dibuat Oleh,





CV. BUJANG DAYANG
GENERAL CONTRACTOR & SUPPLIER

Jl. Perumahan Bukit Kejora Permai, No. H1 RT. 017, Desa Beluluk, Kec. Pangkalan Baru,
Kabupaten Bangka Tengah Telp. 085381084799
Email : bujangdayang@yahoo.com


LAPORAN MINGGUAN FISIK PEKERJAAN

PEKERJAAN : PEKERJAAN PEMASANGAN PARTISI DI FAKULTAS KEDOKTERAAN DAN ILMU KESEHATAN
LOKASI : KAMPUS UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

MINGGU KE -	6
PERIODE	27 Mei 2024 02 Juni 2024

NO	ITEM PEKERJAAN	VOL.	SAT.	BOBOT (%)	S/D MINGGU LALU		S/D MINGGU INI		S/D MINGGU INI		PROGRESS FISIK %	KET.
					VOLUME	BOBOT %	VOLUME	BOBOT %	VOLUME	BOBOT %		
I	PEK. PENDAHULUAN											
	1. Pek. Administrasi dan Dokumentasi	1,00	LS	0,28	0,56	0,16	0,11	0,03	0,67	0,19	66,67	
	2. Pembersihan dan Pembongkaran	1,00	LS	0,28	0,50	0,14		-	0,50	0,14	50,00	
	TOTAL			0,56		0,30		0,03		0,33		
II	PEKERJAAN PASANGAN DINDING PARTISI											
A	PEKERJAAN DINDING DAN LANTAI											
	1. Pek. Pas. Dinding GRC BOARD											
	-Pek. Pas. Rangka Baja ringan Dinding Partisi	253,17	m2	18,23	241,29	17,37		-	241,29	17,37	95,31	
	-Pek. Pas. Dinding GRC Board	472,46	m2	26,20	342,88	19,02		-	342,88	19,02	72,57	
	2. Pek. Pas. Karpet	142,00	m2	3,59	-	-		-	-	-	-	
	3. Pek. Plesteran Lantai Bekas Bongkaran	4,00	m2	0,21	-	-		-	-	-	-	
	JUMLAH - A			48,23		36,39		-		36,39		
B	PEKERJAAN PLAFOND											
	1. Pek. Pas. Rangka Hollow Plafon	142,00	m2	13,76	-	-		-	-	-	-	
	2. Pek. Pas. Plafon PVC	142,00	m2	10,75	-	-		-	-	-	-	
	3. Pek. Pas. Lis Plafon PVC	107,00	m'	1,49	-	-		-	-	-	-	
	JUMLAH - B			26,00		-		-		-		
D	PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA											
	1. Pek. Pas. Pintu HPL	6,00	unit	7,24	-	-		-	-	-	-	
	2. Pek. Pas. Jendela aluminium komplit warna putih	2,00	unit	2,70	-	-		-	-	-	-	
	JUMLAH - D			9,94		-		-		-		
E	PEKERJAAN ELEKTRIKAL											
	1. Pek. Pas. Instalasi Titik Lampu	11,00	titik	1,68	-	-		-	-	-	-	
	2. Pek. Stop Kontak + Instalasi	8,00	titik	0,39	-	-		-	-	-	-	
	3. Pek. Saklar Tunggal	7,00	titik	0,32	-	-		-	-	-	-	
	4. Pas. MCB, 2 group/fase	1,00	titik	0,10	-	-		-	-	-	-	
	5. Pek. Pas. Lampu LED Downlight 19 watt	11,00	titik	0,77	-	-		-	-	-	-	
	JUMLAH - E			3,25		-		-		-		
F	PEKERJAAN FINISHING DAN LABURAN											
	1. Pek. Pegecatan dinding Partisi	472,46	m2	12,02	-	-		-	-	-	-	
	JUMLAH - F			12,02		-		-		-		
	TOTAL - II			99,44		36,39		-		36,39		
	REKAPITULASI											
NO	ITEM PEKERJAAN											
I	PEK. PENDAHULUAN			0,56		0,30		0,03		0,33		
II	PEKERJAAN PASANGAN DINDING PARTISI			99,44		36,39		-		36,39		
	REALISASI FISIK S.D MINGGU INI			100,00		36,69		0,03		36,72		
	RENCANA PROGRESS KUMULATIF (%)									42,52		
	DEVIASI (%)									- 5,81		

Dicatat oleh,




Diperiksa Oleh,

Pegawas Lapangan



Dibuat Oleh,





CV. BUJANG DAYANG
GENERAL CONTRACTOR & SUPPLIER

Jl. Perumahan Bukit Kejora Permai, No. H1 RT. 017, Desa Beluluk, Kec. Pangkalan Baru,
Kabupaten Bangka Tengah Telp. 085381084799
Email : bujangdayang@yahoo.com

LAPORAN MINGGUAN FISIK PEKERJAAN

PEKERJAAN : PEKERJAAN PEMASANGAN PARTISI DI FAKULTAS KEDOKTERAAN DAN ILMU KESEHATAN
LOKASI : KAMPUS UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

MINGGU KE -	7
PERIODE	03 Juni 2024
	09 Juni 2024

NO	ITEM PEKERJAAN	VOL.	SAT.	BOBOT (%)	S/D MINGGU LALU		S/D MINGGU INI		S/D MINGGU INI		PROGRESS	KET.
					VOLUME	BOBOT %	VOLUME	BOBOT %	VOLUME	BOBOT %	FISIK %	
I	PEK. PENDAHULUAN											
	1. Pek. Administrasi dan Dokumentasi	1,00	LS	0,28	0,67	0,19	0,11	0,03	0,78	0,22	77,78	
	2. Pembersihan dan Pembongkaran	1,00	LS	0,28	0,50	0,14	-	-	0,50	0,14	50,00	
	TOTAL			0,56		0,33		0,03		0,36		
II	PEKERJAAN PASANGAN DINDING PARTISI											
A	PEKERJAAN DINDING DAN LANTAI											
	1. Pek. Pas. Dinding GRC BOARD											
	- Pek. Pas. Rangka Baja ringan Dinding Partisi	253,17	m2	18,23	241,29	17,37	11,88	0,86	253,17	18,23	100,00	
	- Pek. Pas. Dinding GRC Board	472,46	m2	26,20	342,88	19,02	54,31	3,01	397,18	22,03	84,07	
	2. Pek. Pas. Karpet	142,00	m2	3,59	-	-	-	-	-	-	-	
	3. Pek. Plesteran Lantai Bekas Bongkaran	4,00	m2	0,21	-	-	4,00	0,21	4,00	0,21	100,00	
	JUMLAH - A			48,23		36,39		4,08		40,47		
B	PEKERJAAN PLAFOND											
	1. Pek. Pas. Rangka Hollow Plafon	142,00	m2	13,76	-	-	74,74	7,24	74,74	7,24	52,63	
	2. Pek. Pas. Plafon PVC	142,00	m2	10,75	-	-	-	-	-	-	-	
	3. Pek. Pas. Lis Plafon PVC	107,00	m'	1,49	-	-	-	-	-	-	-	
	JUMLAH - B			26,00		-		7,24		7,24		
D	PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA											
	1. Pek. Pas. Pintu HPL	6,00	unit	7,24	-	-	-	-	-	-	-	
	2. Pek. Pas. Jendela aluminium komplit warna putih	2,00	unit	2,70	-	-	-	-	-	-	-	
	JUMLAH - D			9,94		-		-		-		
E	PEKERJAAN ELEKTRIKAL											
	1. Pek. Pas. Instalasi Titik Lampu	11,00	titik	1,68	-	-	8,00	1,22	8,00	1,22	72,73	
	2. Pek. Stop Kontak + Instalasi	8,00	titik	0,39	-	-	-	-	-	-	-	
	3. Pek. Saklar Tunggal	7,00	titik	0,32	-	-	-	-	-	-	-	
	4. Pas. MCB, 2 group/fase	1,00	titik	0,10	-	-	-	-	-	-	-	
	5. Pek. Pas. Lampu LED Downlight 19 watt	11,00	titik	0,77	-	-	-	-	-	-	-	
	JUMLAH - E			3,25		-		1,22		1,22		
F	PEKERJAAN FINISHING DAN LABURAN											
	1. Pek. Pegecatan dinding Partisi	472,46	m2	12,02	-	-	295,28	7,51	295,28	7,51	62,50	
	JUMLAH - F			12,02		-		7,51		7,51		
	TOTAL - II			99,44		36,39		20,05		56,44		
REKAPITULASI												
NO	ITEM PEKERJAAN											
I	PEK. PENDAHULUAN			0,56		0,33		0,03		0,36		
II	PEKERJAAN PASANGAN DINDING PARTISI			99,44		36,39		20,05		56,44		
	REALISASI FISIK S.D MINGGU INI			100,00		36,72		20,08		56,80		
	RENCANA PROGRESS KOMULATIF (%)									55,39		
	DEVIASI (%)									1,41		

Disetujui Oleh,

Bahasa Danust Kambari (DDK)

Diperiksa Oleh,

Pegawas Lapangan

Dibuat Oleh,

BUJANG DAYANG



CV. BUJANG DAYANG
GENERAL CONTRACTOR & SUPPLIER

Jl. Perumahan Bukit Kejora Permai, No. H1 RT. 017, Desa Beluluk, Kec. Pangkalan Baru,
Kabupaten Bangka Tengah Telp. 085381084799
Email : bujangdayang@yahoo.com

LAPORAN MINGGUAN FISIK PEKERJAAN


PEKERJAAN : PEKERJAAN PEMASANGAN PARTISI DI FAKULTAS KEDOKTERAAN DAN ILMU KESEHATAN
LOKASI : KAMPUS UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

MINGGU KE -	8
PERIODE	10 Juni 2024
	16 Juni 2024

NO	ITEM PEKERJAAN	VOL.	SAT.	BOBOT (%)	S/D MINGGU LALU		S/D MINGGU INI		S/D MINGGU INI		PROGRESS	KET.
					VOLUME	BOBOT %	VOLUME	BOBOT %	VOLUME	BOBOT %	FISIK %	
I	PEK. PENDAHULUAN											
	1 Pek. Administrasi dan Dokumentasi	1,00	LS	0,28	0,78	0,22	0,11	0,03	0,89	0,25	88,89	
	2 Pembersihan dan Pembongkaran	1,00	LS	0,28	0,50	0,14	-	-	0,50	0,14	50,00	
	TOTAL			0,56		0,36		0,03		0,39		
II	PEKERJAAN PASANGAN DINDING PARTISI											
A	PEKERJAAN DINDING DAN LANTAI											
	1 Pek. Pas. Dinding GRC BOARD											
	- Pek. Pas. Rangka Baja ringan Dinding Partisi	253,17	m2	18,23	253,17	18,23	-	-	253,17	18,23	100,00	
	- Pek. Pas. Dinding GRC Board	472,46	m2	26,20	397,18	22,03	75,27	4,18	472,46	26,20	100,00	
	2 Pek. Pas. Karpas	142,00	m2	3,59	-	-	-	-	-	-	-	
	3 Pek. Plesteran Lantai Bekas Bongkaran	4,00	m2	0,21	4,00	0,21	-	-	4,00	0,21	100,00	
	JUMLAH - A			48,23		40,47		4,18		44,64		
B	PEKERJAAN PLAFOND											
	1 Pek. Pas. Rangka Hollow Plafon	142,00	m2	13,76	74,74	7,24	67,26	6,52	142,00	13,76	100,00	
	2 Pek. Pas. Plafon PVC	142,00	m2	10,75	-	-	142,00	10,75	142,00	10,75	100,00	
	3 Pek. Pas. Lis Plafon PVC	107,00	m'	1,49	-	-	107,00	1,49	107,00	1,49	100,00	
	JUMLAH - B			26,00		7,24		18,75		26,00		
D	PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA											
	1 Pek. Pas. Pintu HPL	6,00	unit	7,24	-	-	4,00	4,83	4,00	4,83	66,67	
	2 Pek. Pas. Jendela aluminium komplit warna putih	2,00	unit	2,70	-	-	2,00	2,70	2,00	2,70	100,00	
	JUMLAH - D			9,94		-		7,52		7,52		
E	PEKERJAAN ELEKTRIKAL											
	1 Pek. Pas. Instalasi Titik Lampu	11,00	titik	1,68	8,00	1,22	3,00	0,46	11,00	1,68	100,00	
	2 Pek. Stop Kontak + Instalasi	8,00	titik	0,39	-	-	8,00	0,39	8,00	0,39	100,00	
	3 Pek. Saklar Tunggal	7,00	titik	0,32	-	-	7,00	0,32	7,00	0,32	100,00	
	4 Pas. MCB, 2 group/fase	1,00	titik	0,10	-	-	1,00	0,10	1,00	0,10	100,00	
	5 Pek. Pas. Lampu LED Downlight 19 watt	11,00	titik	0,77	-	-	-	-	-	-	-	
	JUMLAH - E			3,25		1,22		1,26		2,48		
F	PEKERJAAN FINISHING DAN LABURAN											
	1 Pek. Pegecatan dinding Partisi	472,46	m2	12,02	295,28	7,51	147,64	3,76	442,93	11,27	93,75	
	JUMLAH - F			12,02		7,51		3,76		11,27		
	TOTAL - II			99,44		56,44		35,47		91,91		
REKAPITULASI												
NO	ITEM PEKERJAAN											
I	PEK. PENDAHULUAN			0,56		0,36		0,03		0,39		
II	PEKERJAAN PASANGAN DINDING PARTISI			99,44		56,44		35,47		91,91		
	REALISASI FISIK S.D MINGGU INI			100,00		56,80		35,50		92,30		
	RENCANA PROGRESS KUMULATIF (%)									70,81		
	DEVIASI (%)									21,49		


Disetujui Oleh,

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)




Diperiksa Oleh,

Pegawas Lapangan



Dibuat Oleh,





CV. BUJANG DAYANG
GENERAL CONTRACTOR & SUPPLIER

Jl. Perumahan Bukit Kejora Permai, No. M1 RT. 017, Desa Beluluk, Kec. Pangkalan Baru,
Kabupaten Bangka Tengah Telp. 085381084799
Email : bujangdayang@yahoo.com

LAPORAN MINGGUAN FISIK PEKERJAAN


PEKERJAAN : PEKERJAAN PEMASANGAN PARTISI DI FAKULTAS KEDOKTERAAN DAN ILMU KESEHATAN
LOKASI : KAMPUS UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

MINGGU KE	9
PERIODE	17 Juni 2024
	19 Juni 2024

NO	ITEM PEKERJAAN	VOL.	SAT.	BOBOT (%)	S/D MINGGU LALU		S/D MINGGU INI		S/D MINGGU INI		PROGRESS	KET.
					VOLUME	BOBOT %	VOLUME	BOBOT %	VOLUME	BOBOT %	FISIK %	
I	PEK. PENDAHULUAN											
1	Pek. Administrasi dan Dokumentasi	1,00	LS	0,28	0,89	0,25	0,11	0,03	1,00	0,28	100,00	
2	Pembersihan dan Pembongkaran	1,00	LS	0,28	0,50	0,14	0,50	0,14	1,00	0,28	100,00	
	TOTAL			0,56		0,39		0,17		0,56		
II	PEKERJAAN PASANGAN DINDING PARTISI											
A	PEKERJAAN DINDING DAN LANTAI											
1	Pek. Pas. Dinding GRC BOARD											
	- Pek. Pas. Rangka Baja ringan Dinding Partisi	253,17	m2	18,23	253,17	18,23		-	253,17	18,23	100,00	
	- Pek. Pas. Dinding GRC Board	472,46	m2	26,20	472,46	26,20		-	472,46	26,20	100,00	
2	Pek. Pas. Karpet	142,00	m2	3,59	-	-	142,00	3,59	142,00	3,59	100,00	
3	Pek. Plesteran Lantai Bekas Bongkaran	4,00	m2	0,21	4,00	0,21		-	4,00	0,21	100,00	
	JUMLAH - A			48,23		44,64		3,59		48,23		
B	PEKERJAAN PLAFOND											
1	Pek. Pas. Rangka Hollow Plafon	142,00	m2	13,76	142,00	13,76		-	142,00	13,76	100,00	
2	Pek. Pas. Plafon PVC	142,00	m2	10,75	142,00	10,75		-	142,00	10,75	100,00	
3	Pek. Pas. Lis Plafon PVC	107,00	m'	1,49	107,00	1,49		-	107,00	1,49	100,00	
	JUMLAH - B			26,00		26,00		-		26,00		
D	PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA											
1	Pek. Pas. Pintu HPL	6,00	unit	7,24	4,00	4,83	2,00	2,41	6,00	7,24	100,00	
2	Pek. Pas. Jendela aluminium komplit warna putih	2,00	unit	2,70	2,00	2,70		-	2,00	2,70	100,00	
	JUMLAH - D			9,94		7,52		2,41		9,94		
E	PEKERJAAN ELEKTRIKAL											
1	Pek. Pas. Instalasi Titik Lampu	11,00	titik	1,68	11,00	1,68		-	11,00	1,68	100,00	
2	Pek. Stop Kontak + Instalasi	8,00	titik	0,39	8,00	0,39		-	8,00	0,39	100,00	
3	Pek. Saklar Tunggal	7,00	titik	0,32	7,00	0,32		-	7,00	0,32	100,00	
4	Pas. MCB, 2 group/fase	1,00	titik	0,10	1,00	0,10		-	1,00	0,10	100,00	
5	Pek. Pas. Lampu LED Downlight 19 watt	11,00	titik	0,77	-	-	11,00	0,77	11,00	0,77	100,00	
	JUMLAH - E			3,25		2,48		0,77		3,25		
F	PEKERJAAN FINISHING DAN LABURAN											
1	Pek. Pegecatan dinding Partisi	472,46	m2	12,02	442,93	11,27	29,53	0,75	472,46	12,02	100,00	
	JUMLAH - F			12,02		11,27		0,75		12,02		
	TOTAL - II			99,44		91,91		7,53		99,44		
	REKAPITULASI											
NO	ITEM PEKERJAAN											
I	PEK. PENDAHULUAN			0,56		0,39		0,17		0,56		
II	PEKERJAAN PASANGAN DINDING PARTISI			99,44		91,91		7,53		99,44		
	REALISASI FISIK S.D MINGGU INI			100,00		92,30		7,70		100,00		
	RENCANA PROGRESS KOMULATIF (%)									100,00		
	DEVIASI (%)									-		


Disetujui Oleh,

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)



Diperiksa Oleh,

Pegawas Lapangan



Dibuat Oleh,



AS BUILT DRAWING

CV. BUJANG DAYANG

AS BUILT DRAWING



CV. BUJANG DAYANG

GENERAL CONTRACTOR & SUPPLIER
Jl. Perumahan Bukit Kencana Permata, No. 111, Desa Belutuk,
Kec. Pangkajenean, Kabupaten Unggah Tengah


PEKERJAAN

PEKERJAAN PEMASANGAN PARTISI DI FAKULTAS
KEDOKTERAAN DAN ILMU KESEHATAN


JUDUL GAMBAR

TAMPAK DEPAN DAN BELAKANG

Dit
CV



Dit
Pegawas Lapangan




Diketahui
Pe




SKALA

NO GAMBAR

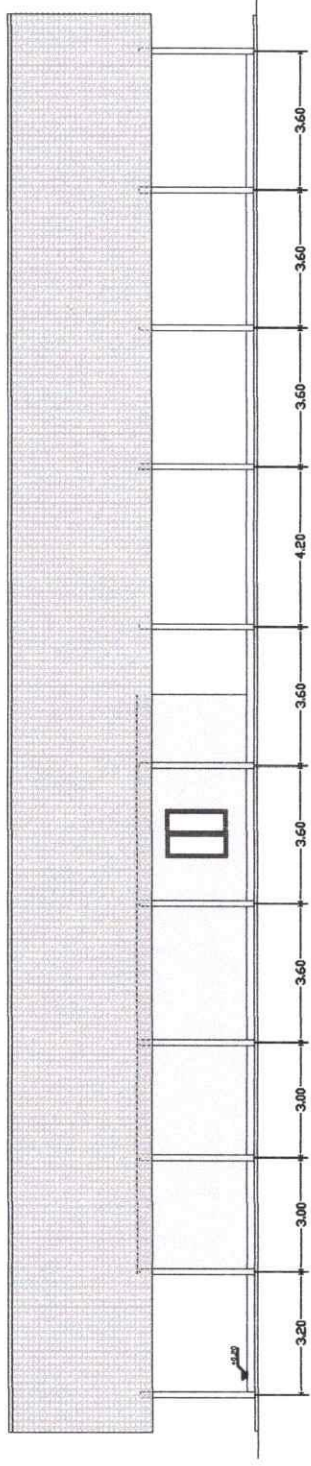

TAMPAK DEPAN

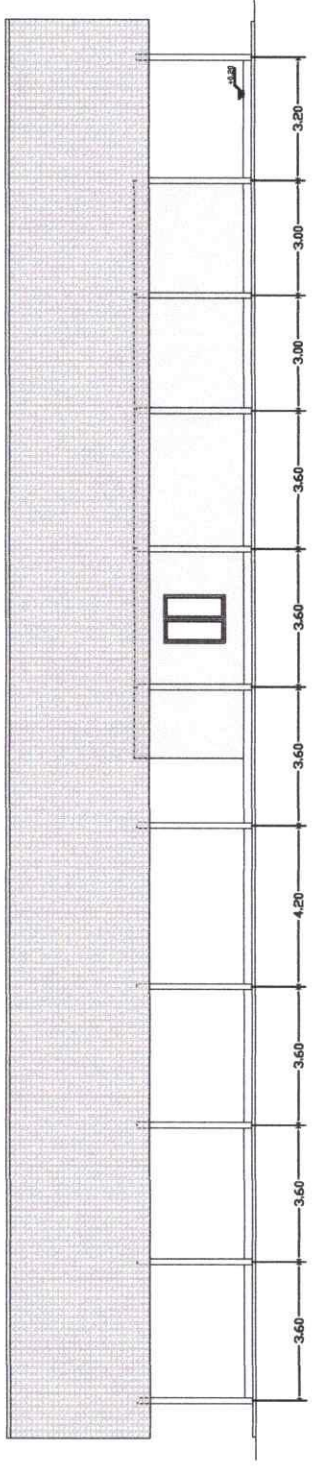

TAMPAK BELAKANG

AS BUILT DRAWING



PEKERJAAN	JUDUL GAMBAR
PEKERJAAN PEMASANGAN PARTISI DI FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN	TAMPAK SAMPIING DAN POTONGAN


JUDUL GAMBAR

TAMPAK SAMPIING DAN POTONGAN

DIPERIKSA
Peg

DIKET
pejabat

SKALA	NO GAMBAR
-------	-----------



TAMPAK S. KIRI



AS BUILT DRAWING



CV. BUJANG DAYANG
GENERAL CONTRACTOR & SUPPLIER


Jl. Perumahan Bukit Kencana Permata, No. 111, Desa Beluluk,
Kec. Pangkajenean, Kabupaten Pangkajenean Tengah

PEKERJAAN

PEKERJAAN PEMASANGAN PARTISI DI FAKULTAS
KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN

JUDUL GAMBAR

DENAH ELEKTRIKAL



PROJEKSI




Di
Fe



SKALA

NO GAMBAR

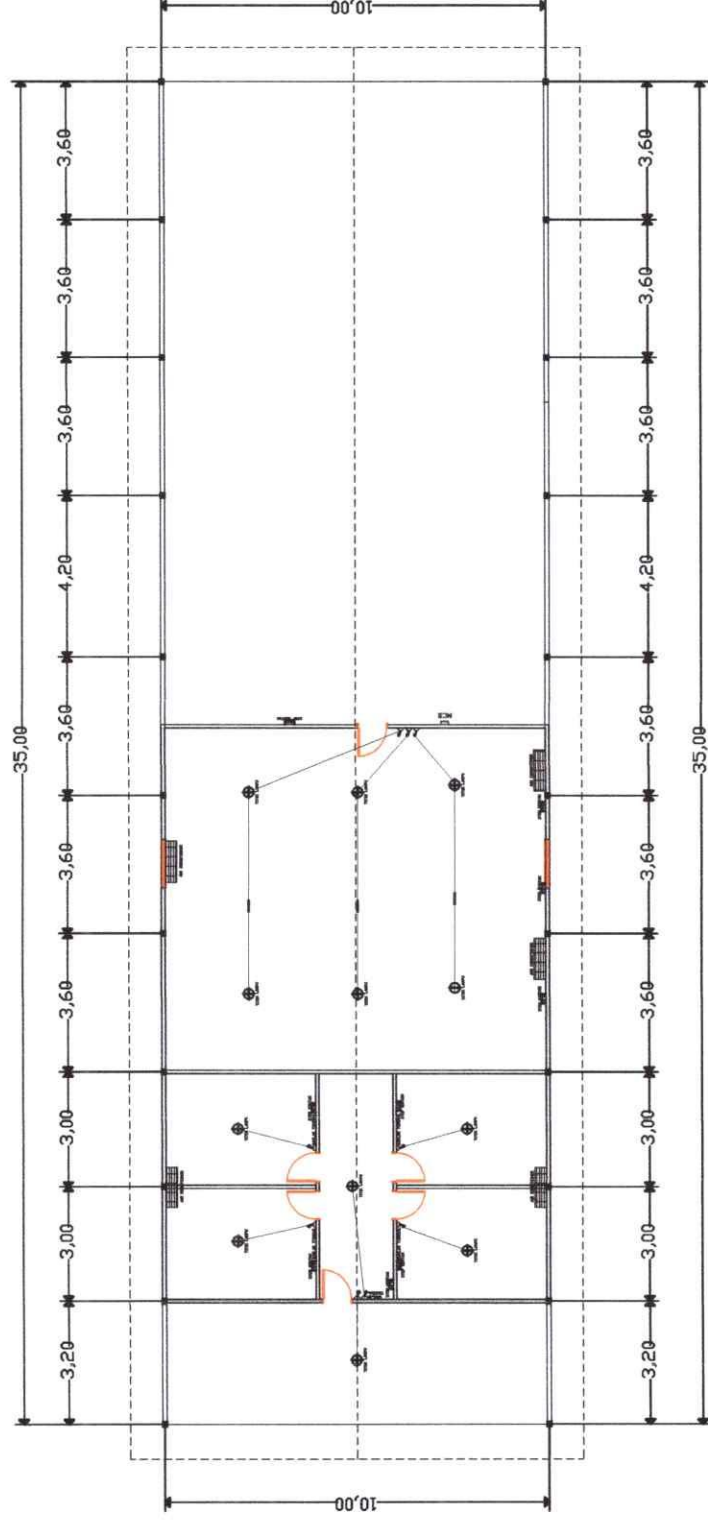

DENAH ELEKTRIKAL

FOTO KEGIATAN

CV. BUJANG DAYANG

FOTO DOKUMENTASI PEKERJAAN PEMASANGAN PARTISI DI FAKULTAS KEDOKTERAAN DAN ILMU KESEHATAN

